

Informe de gestión: Diálogo Ciudadano 2024


SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES CORTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Servicio a la Ciudadanía:

Horarios de atención IDRD Abierto al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. Calle 63 # 59a - 06 Contacto IDRD (601) 6605400 Ext.251 y 252.

Línea anticorrupción: 195 opción 2

Correo de contacto: serviciociudadania@idrd.gov.co **Radicación virtual:** idrdcorrespondencia@idrd.gov.co

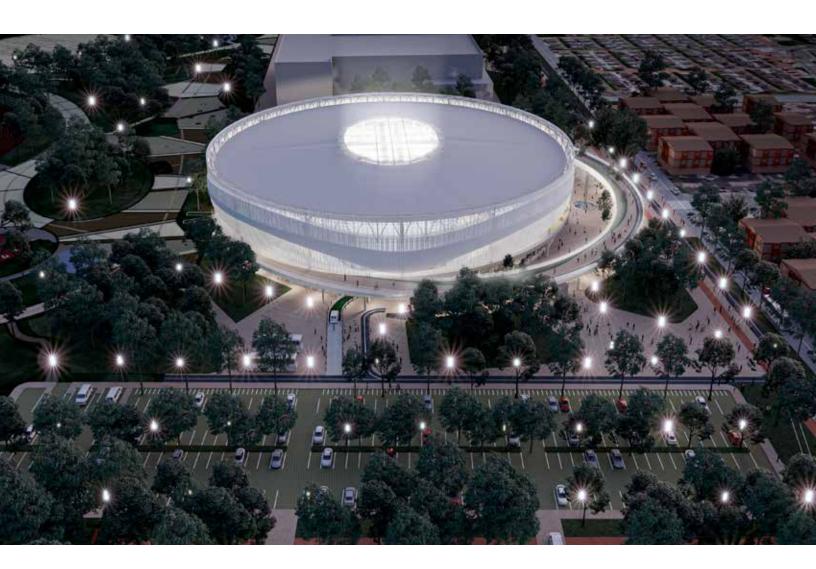

Proyectos de **estudios y diseños STC:**

1. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARD - COD. 12-091

 BENEFICIARIOS:
 16.151 deportistas

 CTO DE DISEÑO 3422-2022:
 \$ 4.234.642.000

 CTO DE INTERVENTORIA 3424-2022:
 \$ 1.190.036.921

 FECHA DE INICIO:
 27/1/2023

 FECHA DE TERMINACIÓN:
 10/10/2024

AVANCE DE EJECUCIÓN: 93%

ESTADO DEL CONTRATO: Suspendido (Licencia de Construcción)

ÁREA DE DISEÑO: 19.342 m2

Alcance del proyecto:

El Centro de Alto Rendimiento Parque Simón Bolívar Sector Parque Recreo Deportivo, es un edificación enfocada al entrenamiento y preparación de deportistas de alto rendimiento y en formación hacia el alto rendimiento del distrito capital. Será referente a nivel nacional por sus prestaciones deportivas y por su ubicación privilegiada. Busca inspirar a deportistas y ciudadanos combinando una plataforma deportiva innovadora con un edificio flexible y articulado a su entorno, con lineamientos de sostenibilidad y que incorpore estrategias que permitan su uso como parte del espacio público que potencie las cualidades paisaiísticas del lugar.

Esta edificación será única en la ciudad ya que contará con la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deportes - UCAD la cual contará con los equipos de última tecnología para la atención al deportista para el desarrollo de su vida deportiva. Por otro lado contará con espacios para el desarrollo de los siguientes deportes: Tiro, Halterofilia, Karate Do, Taekwondo, Hapkido, Judo, Lucha, Tenis de Mesa, Bádminton, Balonmano, Voleibol, Basquetbol, Futbol Sala y deportes paralímpicos los cuales son: Boccia, Voley sentado, Para Tenis de mesa, Parabadminton, Powerlifting, Para Tiro Deportivo. Ahora bien también se desarrollaron espacio para deportes alternativos los cuales son: Goalball, Dodgeball, Korfball, Kinball, Tchouball, Baloncesto 3x3, Skateboarding, Freestyle BMX, Fistball, Sepak Takraw, Teqball, Manbol, Ultimate, Parkour. Por último los espacios complementarios tales como: Auditorio, Centro de Perfeccionamiento de la Fuerza, Comedor, Cafetería, Coworking, Zona Equipo Bogotá.





Alcance del proyecto:

Fueron ejecutadas 3 reuniones de socialización de inicio, avance y finalización los días 24 de febrero de 2023, 16 de junio de 2023 y 14 de diciembre de 2023 ejercicios en los cuales se socializaron características del contrato avances del diseño y anteproyecto con la comunidad beneficiaria.

Programa de caracterización:

Fueron aplicadas 234 encuestas y 13 entrevistas a deportistas de alto rendimiento, entrenadores, líderes de escuelas de formación deportiva y presidentes de liga para conocer sus necesidades y observaciones metodológicas, así como sus necesidades en términos de productos y servicios a tener en cuenta en el diseño: Entregables Diagnóstico Social y Estudio de Mercado.

Canales de atención a la ciudadania:

Hernán Alexis Cobos

Profesional Social Consultor

Teléfono: 301 5177796

Correo electrónico: alexix22@yahoo.com

Días y horarios de atención telefónica: Lunes a sábado, 8:00 a.m.- 4:00 p.m





2. PARQUE SANTA LUCIA FASE II - COD. 18-073:

 BENEFICIARIOS:
 16.151 deportistas

 CTO DE DISEÑO 3422-2022:
 \$ 4.234.642.000

 CTO DE INTERVENTORIA 3424-2022:
 \$ 1.190.036.921

 FECHA DE INICIO:
 27/1/2023

 FECHA DE TERMINACIÓN:
 10/10/2024

AVANCE DE EJECUCIÓN: 93%

ESTADO DEL CONTRATO: Suspendido (Licencia de Construcción)

ÁREA DE DISEÑO: 19.342 m2

Construcción de sendero peatonal que permitirá la conexión de los dos parques existentes, construcción de dos módulos de baños, instalación eléctrica y cerramiento.

Canales de atención a la ciudadania:


Atención a la comunidad: Teléfono: 324 3025207

Correo electrónico: socialsenderosantalucia@gmail.com

Días y horarios de atención: Lunes a viernes 10:00 a.m. a 4:00 p.m.





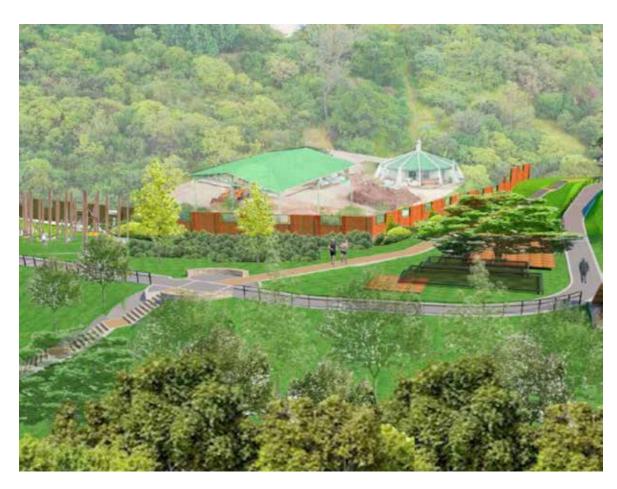

3. CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS - COD. 10-290:

BENEFICIARIOS: 5.579 deportistas beneficiarios

CTO DE DISEÑO Y OBRA 3113-2023: \$ 43.951.576.181
CTO DE INTERVENTORIA 3164-2023: \$ 4.153.880.133
FECHA DE INICIO: 23/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16/9/2025

AVANCE DE EJECUCIÓN ETAPA DISEÑOS: 47% **AVANCE DE EJECUCIÓN GENERAL:** 2.4%

ESTADO DEL CONTRATO: Ejecución Etapa de Actividades Complementarias

AnteprOvecto (Estudios y Diseños)

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 10.100 M2

Alcance del proyecto:

Construcción de edificio con espacios para el entrenamiento de alto rendimiento y en formación al alto rendimiento de las siguientes disciplinas deportivas: Boxeo, Ajedrez, Gimnasio, Esgrima, Karate Do, Lucha olímpica, Levantamiento de pesas, Judo, Karate, Taekwondo, Baloncesto, Voleibol, Fútbol sala, Futbol salón, Balonmano, Bádminton y Tenis de Mesa, Hapkido, Muro de Escalar, Tejo y espacios complementarios tales como: Auditorio, Vestidores, Bodegas, Co-working, Cafetería, Centro de Perfeccionamiento de la Fuerza, Tienda Deportiva y zonas de entrenamiento al aire libre (Terraza - Cubierta Verde).

Programa de información:

Se han ejecutado 2 reuniones informativas, inicio llevado a cabo el día 9 de febrero de 2024 y reunión de avance el 23 de agosto de 2024.

Programa de caracterización:

Se realizó aplicación de 401 encuestas y 13 reuniones con metodólogos como insumos para la construcción del diagnóstico social y estudio de mercado social.





Canales de atención a la ciudadania:

Xexetni Crespo

Profesional Social Consultor

Teléfono: 3212118797

Correo electrónico: Consultoriasocial10290@gmail.com

Días y horarios de atención telefónica: Lunes a sábado, 8:00 a.m.- 4:00 p.m











Consultoría

1. CONSULTORÍA SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES -**FASE II:**

CONTRATO DE CONSULTORÍA 3276-2023: \$ 4.850.737.500 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3280-2023:** \$ 1.829.395.679 19/1/2024 **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/11/2024 57%

AVANCE DE EJECUCIÓN:

ESTADO DEL CONTRATO: En Ejecución

ALCANCE DEL PROYECTO:





Proyectos en etapa de obra

1. PARQUE LINEAL AMBIENTAL UNIDAD DE PAISAJE 3 – COD. 11-1362:

BENEFICIARIOS: 259983

CTO DE OBRA 3144-2023: \$ 14.372.120.021
CTO DE INTERVENTORIA 3159-2023: \$ 1.651.965.842
FECHA DE INICIO: 9/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 12/07/2024
AVANCE DE EJECUCIÓN: 24,5%
ESTADO DEL CONTRATO: Suspendido
ÁREA DE INTERVENCIÓN: 53389,39 m2

Alcance del proyecto:

Construcción de senderos peatonales, senderos para bicicletas, observatorio de aves, estaciones de descanso con mobiliario, zona de juegos infantiles, zonas de entrenamiento funcional, canchas deportivas y zonas (mascotas) PET, uso de energías renovables para el alumbrado público.

Programa de información:

Se llevó a cabo reunión de inicio el día 28 de noviembre de 2023 y 7 reuniones extraordinarias con vecinos, autoridades del Cabildo Indigena Muisca de Suba y ambientalistas. También en el marco del programa de control social se han adelantado 2 comités de participación ciudadana.







Canales de atención a la ciudadania:

Yenny Alexandra Casas

Profesional Social Contratista

Teléfono: 3228465899

Correo electrónico: socialparquelineal@gmail.com

Dirección punto físico: Diagonal 147B No. 141A. 42 bloque C4 Interior 27

Días y horarios de atención: Lunes y martes 9:00 a.m. a 12:00 m. Miércoles y jueves de 2:00 p.m.- 4:00

p.m. Sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.

El proyecto en su contexto contiene mecanismos tanto de seguimiento como de atención a requerimientos y subsanación de observaciones por parte de la comunidad, primero mediante comités de participación mensuales e información más extensa al momento de llegar el contrato a una ejecución del 50%, además de esto la interventoría (contrato IDRD 3159 de 2023) cuenta con un canal de atención presencial y via correo electronico para solucionar dudas y/o quejas.

Proyección



Obra







2. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR GIBRALTAR - COD. 08-110:

(Cofinanciación regalías)

BENEFICIARIOS: 579032

CTO DE OBRA 3203-2023: \$151.550.192.040
CTO DE INTERVENTORIA 3219-2023: \$7.355.821.720
FECHA DE INICIO: 6/2/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 5/4/2026
AVANCE DE EJECUCIÓN: 1,5%

ESTADO DEL CONTRATO: En Ejecución **ÁREA DE INTERVENCIÓN:** 33.947,74 m2

Proyección

















Programa de formación:

Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de socialización de inicio el día 15 de marzo de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 17 de abril de 2024, 15 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024, 17 de julio de 2024 y 21 de agosto de 2024; actividades en las cuales se presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los componentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.

Canales de atención a la ciudadania:

Atención a la comunidad por CONSORCIO GIBRALTAR:

Profesional social Contratista: María Isabel Rocha Romero

Punto fijo de atención a la ciudadanía: Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio El Porvenir) Días y horarios de atención presencial: Lunes y miércoles: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Martes y jueves: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Día y horario de atención virtual: Sábados: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Teléfono: 321 347 12 89

Correo electrónico: social.consorciogibraltar@gmail.com









3. **VELODROMO – COD 08-110:**

BENEFICIARIOS: 579032

CTO DE OBRA 3232-2023: 132.821.646.606
CTO DE INTERVENTORIA 3219-2023: \$7.607.817.556
FECHA DE INICIO: 6/2/2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 5/4/2026

AVANCE DE EJECUCIÓN: 2%

ESTADO DEL CONTRATO: En Ejecución ÁREA DE INTERVENCIÓN: 43937 M2

Alcance del proyecto

Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de socialización de inicio el día 15 de marzo de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 17 de abril de 2024, 15 de mayo de 2024, 19 de junio de 2024, 17 de julio de 2024 y 21 de agosto de 2024; actividades en las cuales se presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los componentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.

Proyección



Obra





Programa de información:

Se han ejecutado 6 ejercicios de participación: 1 reunión de socialización de inicio el día 8 de marzo de 2024 y 5 comités de participación ciudadana y control social los días 18 de abril de 2024, 16 de mayo de 2024, 20 de junio de 2024, 18 de julio de 2024 y 22 de agosto de 2024; actividades en las cuales se presentó a la comunidad y miembros del comité de participación ciudadana las características del proyecto, alcance de las obras, planes y programas a implementar y avances de ejecución en los componentes técnico, social, ambiental, sst y se aclararon dudas frente a la ejecución del contrato.









Canales de atención a la ciudadania:

Atención a la comunidad por CONSORCIO GIBRALTAR:

Profesional social Contratista: María Isabel Rocha Romero

Punto fijo de atención a la ciudadanía: Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio El Porvenir)

Días y horarios de atención presencial: Lunes y miércoles: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Martes y jueves: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Día y horario de atención virtual: Sábados: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.


Teléfono: 321 347 12 89

Correo electrónico: social.consorciogibraltar@gmail.com

Reporte de vinculación laboral Subdirección Técnica de Construcciones:

| REPORTE VINCULACIÓN LABORAL Y DE GOBIERNO DE EMPLEO | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| PROYECTO | EMPLEOS TOTALES | EMPLEOS MUJERES | EMPLEOS JÓVENES | EMPLEO LOCAL | EMPLEOS DIRECTOS | EMPLEOS INDIRECTOS | | |
| CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CARD - COD. 12-091 | 53 | 16 | 1 | 11 | 49 | 4 | | |
| CED COMPLEJO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO COD. 12-125 | 30 | 8 | 2 | 30 | 0 | 30 | | |
| CONSULTORÍAS SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES - FASE II | 42 | 22 | 6 | 42 | 34 | 8 | | |
| PARQUE SANTA LUCÍA FASE II COD. 18-073 | 38 | 17 | 4 | 0 | 38 | 0 | | |
| PARQUE LINEAL AMBIENTAL UNIDAD DEL PAISAJE 3 - COD. 11-1362 | 135 | 27 | 1 | 13 | 44 | 91 | | |
| CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR GIBRALTAR - COD 08-110 | 73 | 17 | 4 | 2 | 73 | 4 | | |
| VELÓDROMO - COD. 08-110 | 73 | 19 | 8 | 4 | 73 | 0 | | |
| TOTAL | 444 | 126 | 26 | 102 | 311 | 137 | | |

Dando cumplimiento al Plan de Gobierno Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", la Subdirección Técnica de Construcciones adelanta la transvesalización y territorialización del enfoque diferencial y de género con la implementación de las siguientes acciones:



Contratación de población vulnerable, enfoque diferencial y de género.

Metas de la Subdirección **Técnica de Construcciones**

Para el primer semestre de 2024, la Subdirección Técnica de Construcciones finalizó la ejecución del Proyecto de inversión 7856 – Construcción y adecuación de escenarios y/o parques deportivos sostenibles para la revitalización urbana en Bogotá, cumpliendo desde año 2023 con la programación de metas establecidas para el cuatrienio, sin embargo, se presenta a continuación las acciones más relevantes desarrolladas durante el primes semestre en el marco del citado proyecto

PMETA 1. Realizar el 100% de los estudios y diseños, interventoría y consultoría de parques y/o escenarios deportivos:

Para la vigencia 2024 la meta no cuenta con recursos programados ni magnitud, sin embargo, se realiza el seguimiento al Procesos del Sistema Distrital de Parques - Fase II el cual se encuentra en ejecución:

SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES Y ESCENARIOS – IDRD

Objeto: Desarrollar una metodología de diagnóstico y el levantamiento por tecnología GNSS para la captura de información geográfica de la infraestructura física de los parques que no se encuentran incorporados en el visor geográfico sistema distrital de parques y escenarios IDRD.

Valor contratado con recursos 2023: \$ 6.680.133.179 (Contrato de Consultoría No. 3276-2023: \$ 4.850.737.500 y Contrato de Interventoría No. 3280-2023: \$ 1.829.395.679).

Para el mes de junio se está tramitando acta de recibo parcial no 1, actualmente el consultor ha levantado en campo 2,653 parques que corresponde al 50% de los parques levantados en el contrato.

META 2. Construir y/o adecuar 9,4 parques y/o escenarios deportivos:

La meta cumplió con la magnitud programada para el cuatrienio en la vigencia 2023, sin embargo, al Subdirección Técnica de Construcciones se encuentra ejecutando los siguientes contratos de obra e interventoría en el marco de la citada meta:

Procesos en ejecución:

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESTRUCTURANTE SANTA LUCÍA, Cód. 18-073

Objeto: realizar la ingeniería de detalle y la construcción del sendero peatonal y obras complementarias para la conexión de los dos sectores que conforman el parque Santa Lucia código IDRD 18 073 localidad de Rafael Uribe e interventoría.

Valor contratado con recursos 2022: \$4.915.467.337 (contrato de obra No. 3330-2022: \$4.217.318.886 y contrato de interventoría No. 3366-2022 por valor de \$698.148.451).

Avance 6%: De acuerdo con el cronograma del contratista aprobado por la interventoría, se están realizando las siguientes actividades:

Se realiza ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 de los contratos de obra no. 3330-2022 y contrato de interventoría No. 3366 -2022; desde el día 19 de diciembre de 2022 hasta el día 18 de marzo de 2024.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KENNEDY

Objeto: Contratar las obras y actividades complementarias del velódromo ubicado en el parque metropolitano el porvenir Gibraltar en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Valor contratado con recursos 2023: \$ 140.429.464.162,00 (Contrato de Obra No. 3232-2023: \$ 132.821.646.606 y Contrato de Interventoría No. 3219-2023: \$7.607.817.556).

Se culminó la instalación de cerramiento cubriendo cerramiento existente, distribuidos de la siguiente manera cerramiento paralelo carrera 91 y cerramiento paralelo calle 49 sur. Se culminó la actividad de tala, cargue y retiro de los 181 individuos arbóreos aprobados bajo resolución no. 01639 de 2023, a los cuales se le realizaron las siguientes actividades trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material.

Se identificaron 2 placas de concreto existentes de diferentes espesores de 8cm y 30 cm. Se realizó la actividad de descapote en zona de parqueadero y retiro de material desde el sitio de la obra hasta el sitio de aprovechamiento de material producto de la excavación del terreno.

Se programó el tercer comité de participación ciudadana el 20 de junio del 2024.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PORVENIR GIBRALTAR, LOCALIDAD DE KENNEDY

Objeto: Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir Gibraltar en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Valor contratado con recursos 2023: \$158.906.013.760 (Contrato de Obra No. 3203-2023: \$151.550.192.040 (Regalías 143.772.299.900 y Cupo Crédito 7.777.892.140) y Contrato de Interventoría No. 3219-2023: \$7.355.821.720 Cupo Crédito).

- Se realizan actividades de descapote y disposición de capa vegetal para carreteable ubicado por el costado no-oriental del proyecto.
- Se ejecuta construcción de cerramiento en lámina ubicado en el costado sur-oriental y costado nor-oriental del proyecto.
- Se ejecuta instalación provisional eléctrica con la instalación de gabinetes y puesta a tierra ubicado en el costado oriental del proyecto.
- Se realizan actividades de localización y replanteo del proyecto.
- Se ejecuta suministro, extendido, nivelación y compactación de recebo común para carreteable y plataforma ubicados en costado oriental y norte del proyecto.
- Se avala el informe mensual técnico No. 2 v2 de interventoría y remite al contratista la aprobación del informe mensual técnico no.3 v2.
- Se programó el tercer comité de participación ciudadana para el 19 de junio del 2024.
- Se carga la información del seguimiento de la interventoría a la implementación BIM (14 formatos de control), así como las actas de reuniones (10) al centro común de datos.
- Se crea el control de avance para la implementación BIM, el cual está basado en el avance que tiene cada actividad en términos de modelamiento, coordinación, simulación 4d (estructura) y modelos récord.
- Avance en actividad pilotes hincados modelación 25%.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS Código 10-290

Objeto: contratar las obras y actividades complementarias del centro de entrenamiento deportivo UDS CODIGO IDRD 10 290

Valor contratado con recursos 2023: \$48.105.456.314. (contrato de obra No. 3113-2023: \$43.951.576.181 y contrato de interventoría No. 3159-2023 por valor de \$4.153.880.133).

Avance 47% los cuales corresponden a la fase de actividades complementarias se realiza el comité de seguimiento No. 16 el pasado 06 de febrero de 2024, durante la presente semana se realiza el avance de las actividades de los diseños y coordinación entre especialidades.

Actualmente se encuentra en desarrollo por parte del contratista de obra y posterior aprobación de la interventoría, los componentes y entregables que corresponden a la etapa de anteproyecto.

Se realizan las reuniones pertinentes al seguimiento y cumplimiento de los compromisos tendientes ante los permisos solicitados IDPC y documento de presupuesto.

Continua subsanación por parte del consultor con respecto a los entregables del componente de esquema básico, a fin de que la interventoría realice las respectivas revisiones, y emitir concepto para radicación física.

Se realiza comité a fin de mostrar avances de acuerdo con observaciones de interventoría, se indica que una vez revisada la información se podría dar aval a ciertas especialidades a fin de adelantar el modelado BIM.

Por parte de la interventoría, se realizan reuniones de seguimiento a los productos pendientes de entrega por parte de la consultoría que permitan atender los requerimientos del IDRD.

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL AMBIENTAL PAISAJE 3 Código 11-1362

Objeto: contratar por el sistema de precios unitarios fijos las obras del parque lineal ambiental correspondientes a la unidad de paisaje 3.

Valor contratado con recursos 2023: \$ 16.024.085.863 (Contrato de Obra No. 3144-2023: \$14.372.120.021 y Contrato de Interventoría No. 3259-2023: \$ 1.651.965.842).

Avance para junio de un 24% de obra con las siguientes actividades:

- Excavación mecánica y cargue retiro en el tramo C.
- Relleno de rajón manual en el tramo c.
- Relleno afirmado compactación en los tramos A y C
- Suministro e instalación de geotextil tramo A, B y C
- Bordillo prefabricado tramo A, B y C
- Sardinel prefabricado tramo A, B y C
- Canalización ducto eléctrico zona dura tramo A

PERSONAL: Se realizan adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.

META 3. Adelantar el 100% de la gestión administrativa de los diferentes proyectos de infraestructura de parques y escenarios deportivos en fase final y de liquidación: a 30 de junio de 2024 presentó una ejecución del 14% correspondiente a la ejecución de \$ 1.471.958.750 de \$10.298.110.902 programados.

Se realizan adición y prórroga a contrato de prestación de servicios.

En cuanto a los pasivos se realizaron el pago de los siguientes compromisos:

| PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES A 30 DE JUNIO DE 2024 | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|---------------|--|--|--|
| BENEFICIARIO | No. CONTRATO | ОВЈЕТО | FECHA DE PAGO | VALOR | | | |
| 901650251-CONSORCIO SANTA ISABEL 056 | 3010 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CTO INTERVENTORÍA 3010 2022 CONSORCIO SANTA ISABEL 056 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA SOCIAL AMBIENTAL SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL PLAN DE RESTAURACION Y RECUPERACION Y LA CONSTRUCCION DEL PARQUE BUENAVISTA EL PORVENIR CÓDIGO IDRD 19 347 FASE 2 | 03/07/2024 | 90.259.283,00 | | | |
| 1013629267-LAURA MELISA CARDENAS BARRAGAN | 3248 | PAGO PASIVO EXIGIBLE CPS 3248 2022 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SANEAMIENTO DE LAS URBANIZACIO- NES PREDIOS Y CONSTRUCCIONES DEL INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES | 05/14/2024 | 141.467,00 | | | |





